


夜須認定こども園整備事業

事業概要

津波浸水予測区域に位置する夜須保育所及び夜須幼稚園を高台移転し、こどもの安心・安全を確保するとともに、両施設を統合し新たに幼保連携型認定こども園として開設する。これに伴い、交通量の増加も想定されるため、周辺道路の整備も併せて行う。

- R2 用地取得(令和3年11月完了) 造成設計(令和3年6月完了) 建築設計(令和4年1月完了)
- R3 造成工事(建設課:令和3年11月着工 **令和4年10月完成予定**)
周辺道路改良設計(建設課:令和3年10月着手 令和4年3月完了)
- R4 **建築工事(建築主体、電気設備、機械設備) 923,100千円** (当初850,000千円から73,100千円増額)
監理委託業務 15,000千円
工事積算書単価振替委託業務 1,000千円 (入札関連業務として追加)
監理技術支援委託業務 1,800千円 (発注業務及び工事の技術支援補完のため追加)
ネットワーク整備工事 及び イン트라ネット整備工事 5,900千円 (当初5,000千円から900千円増額)
警備設備工事 及び 防犯カメラ設置工事 2,200千円 (関連事業として追加)
駐車場整備工事 24,400千円 (当初10,000千円から14,400千円増額)
水道管布設替工事設計委託業務 2,500千円 (関連業務として追加)
水道管布設替工事 5,000千円 (関連事業として追加)
防火水槽設置工事 (消防本部:設計監理含め20,400千円)
夜須幼稚園土地現況復旧設計費 1,000千円
- R5 開園(幼保連携型認定こども園)
土地現況復旧工事 7,000千円

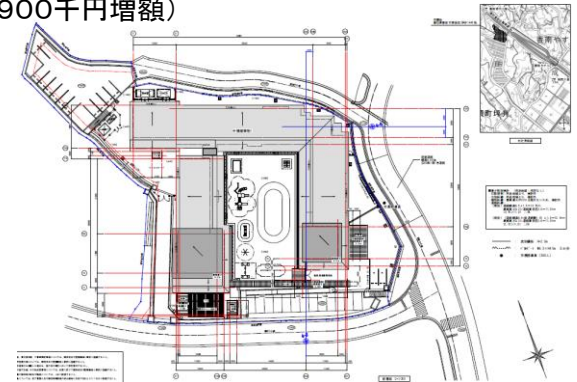

債務負担行為限度額

【令和4.5年度の債務負担行為限度額】 **980,900千円** (上記事業概要の赤字に示す業務や工事)

当初 880,000千円から
100,900千円増額必要

水道管布設工事など関連する周辺環境整備の追加及び費用精査
造成工事完了時期に合わせての入札に適用する適正単価の見込み

【増額となった背景】 高知県建設技術公社から「令和4年に入り木材等建築資材が著しく高騰しており、実際に工事着手する時期の資材価格が見通せないことによる入札参加業者の減少、不落の懸念がある」との指摘から、資材高騰状況を見越した単価振替及び資材納入時期を確認したうえで、造成工事完了時期に合わせて入札することになり、現時点での試算(推計)により、増額が必要な状況になった。

夜須認定こども園整備事業

スケジュール

